


**Commission de Suivi des Sites
carrière St Julien M.M. / Colombier
le 23 novembre 2017**


Ordre du jour


- Synthèse de la dernière inspection du site par la DREAL
 - Bilan annuel d'activité
 - Projets en cours
- 

Phase 3

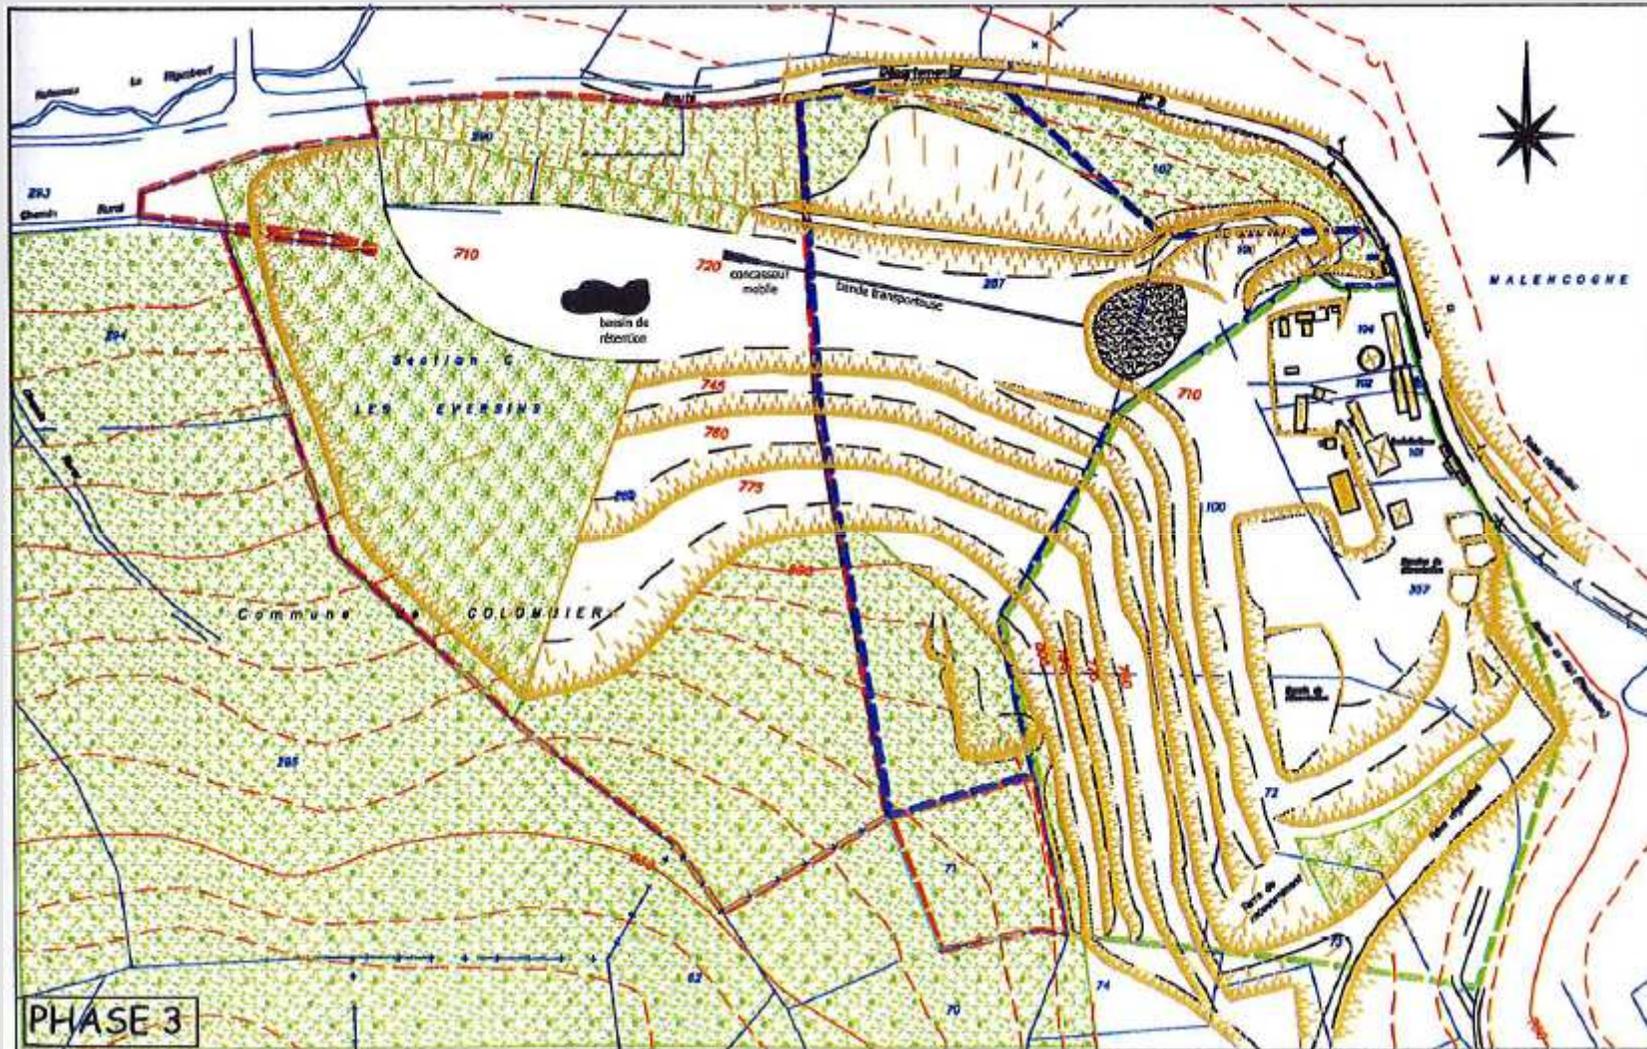


- Raccordement des fronts
- Poursuite des travaux de la 2^{ème} phase du talus NORD
- Exploitation d'Est en Ouest en dent creuse

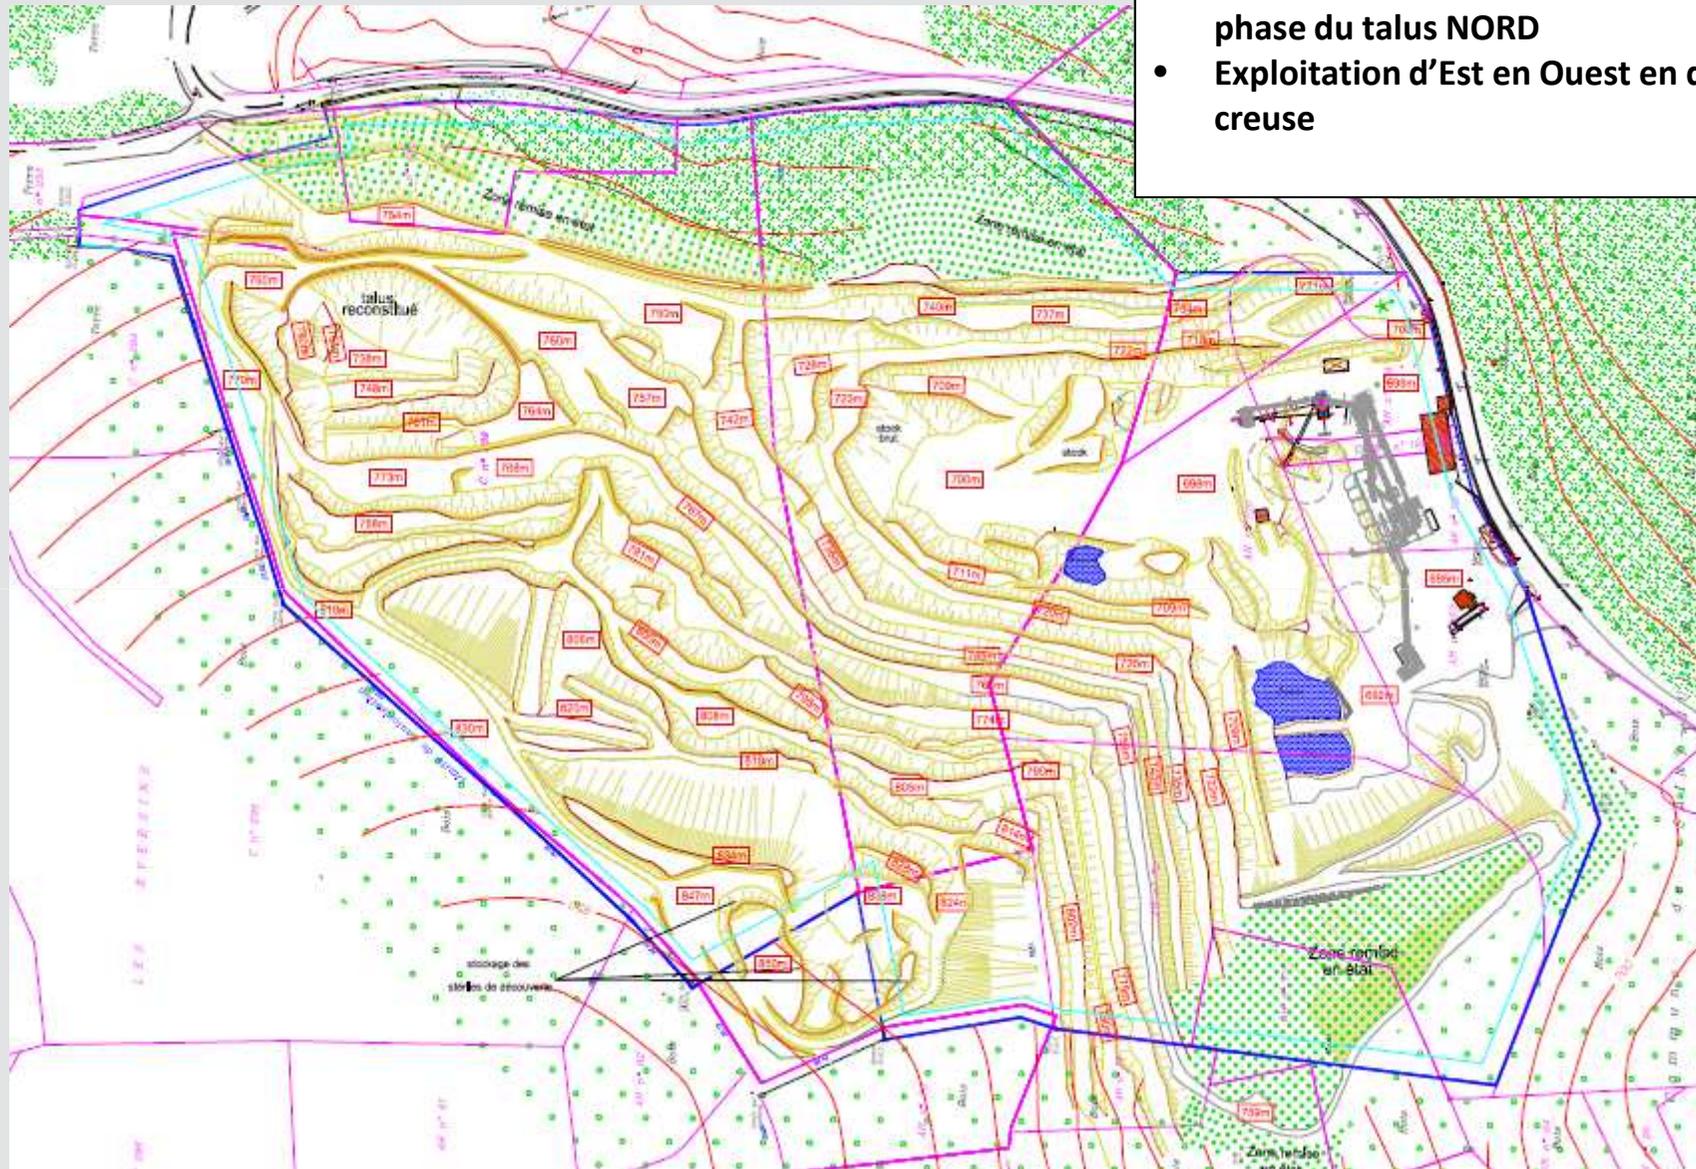

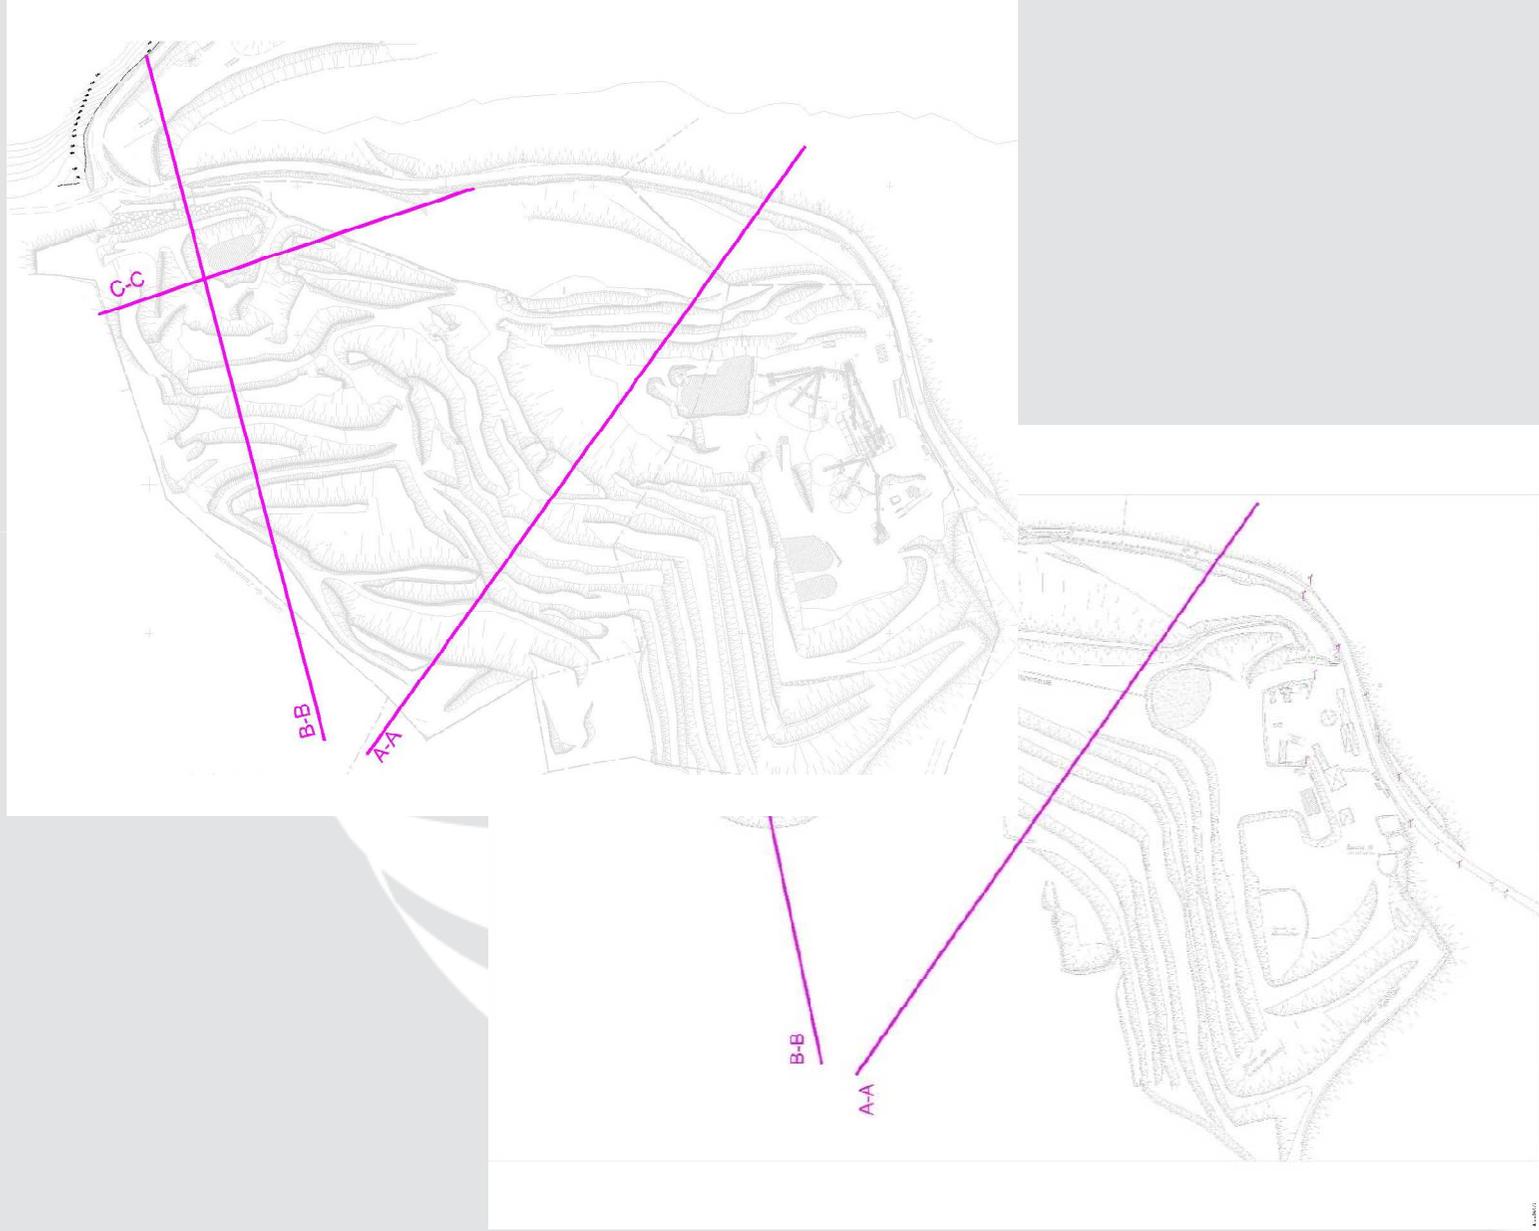

coupe A-A


- profil octobre 2017
- profil phase 3
- profil phase 4

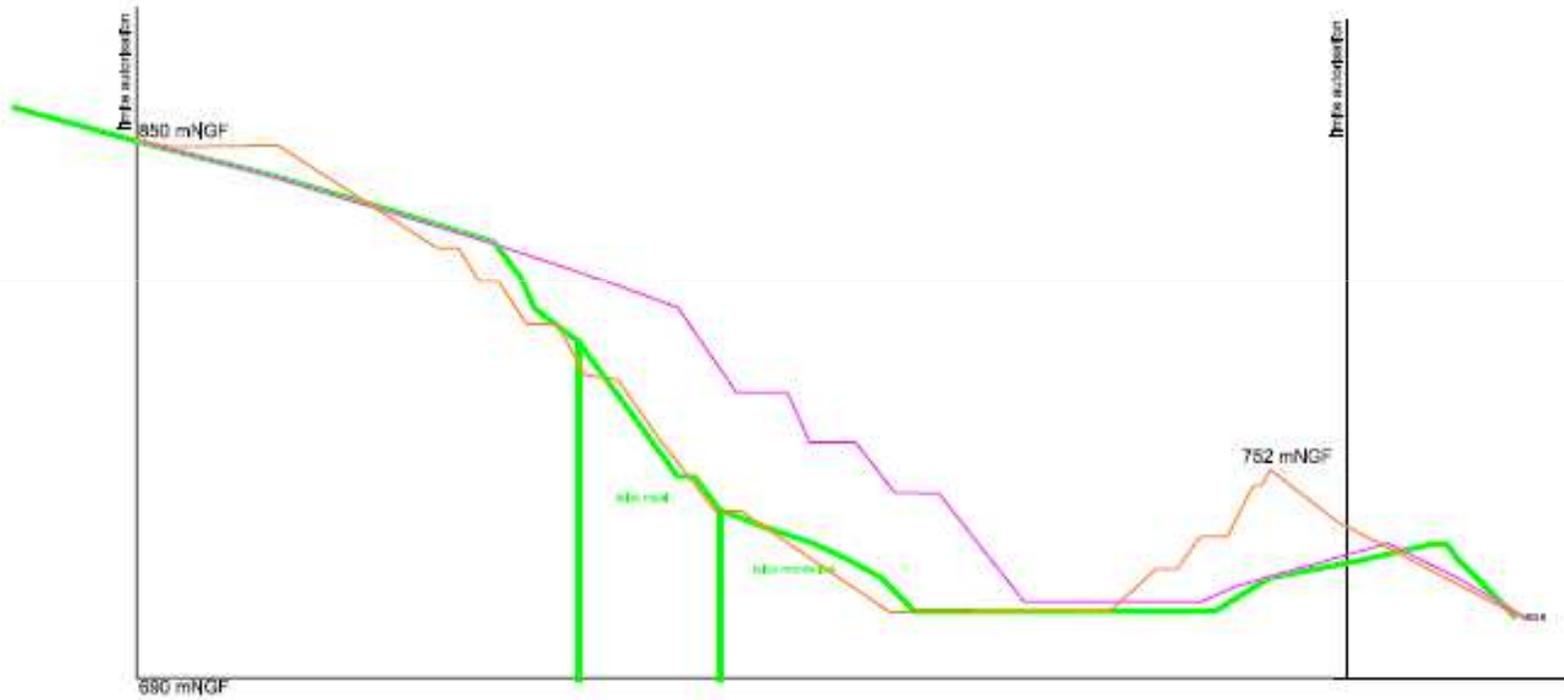

coupe B-B

- profil octobre 2017
- profil phase 3
- profil phase 4

0m 10m 25m 50m 100m

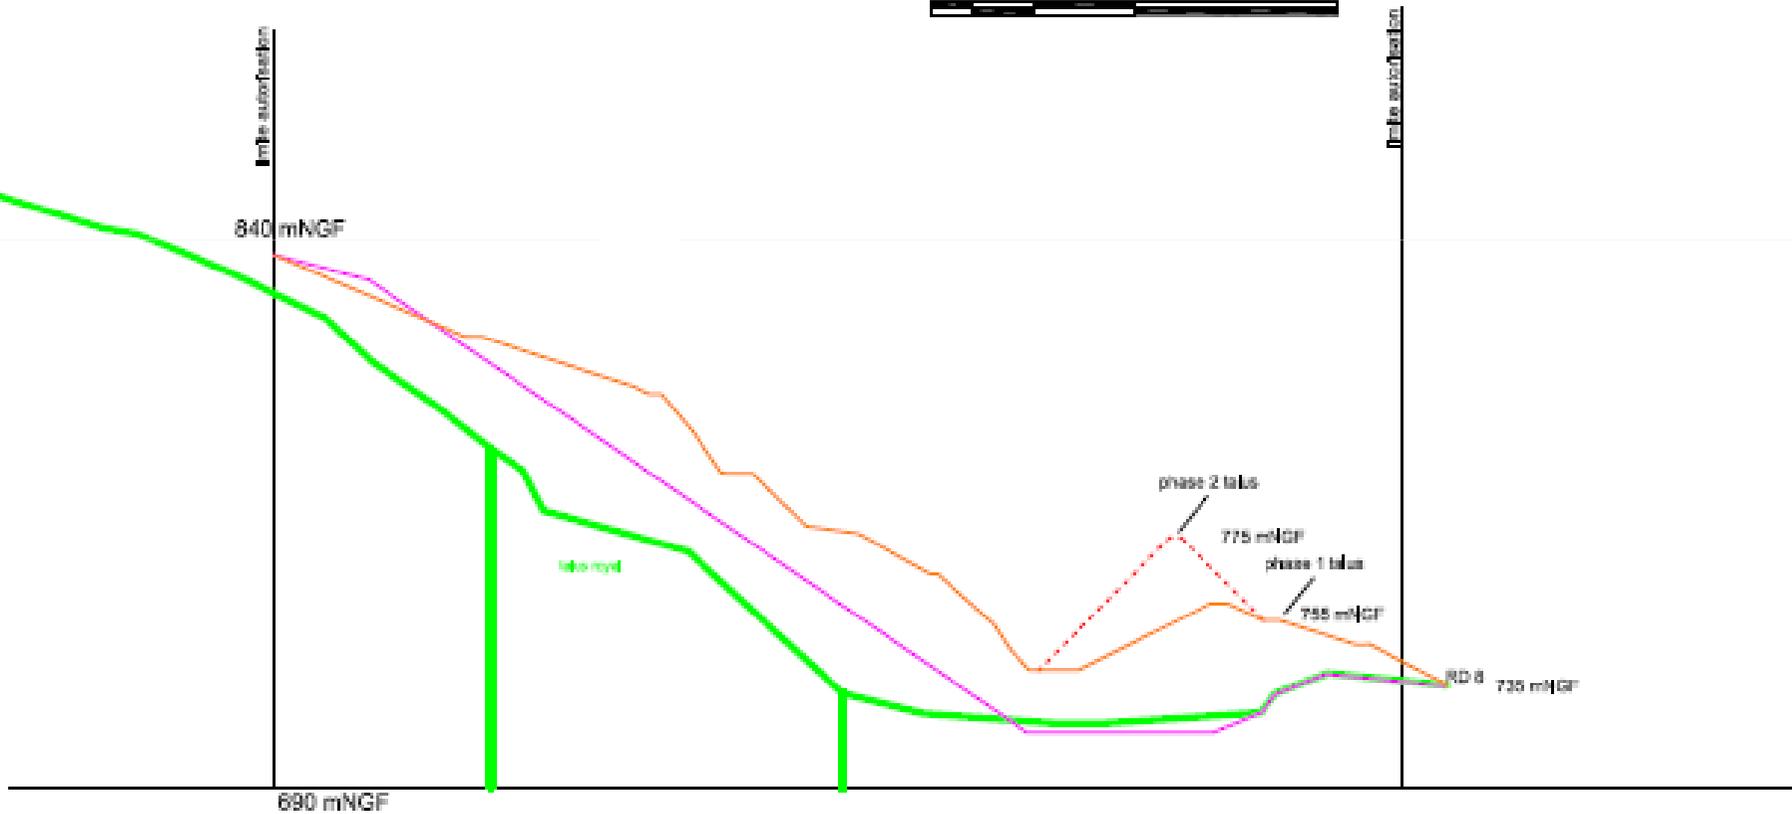


coupe C-C

— profil octobre 2017

— profil phase 3

0m 10m 25m 50m 100m

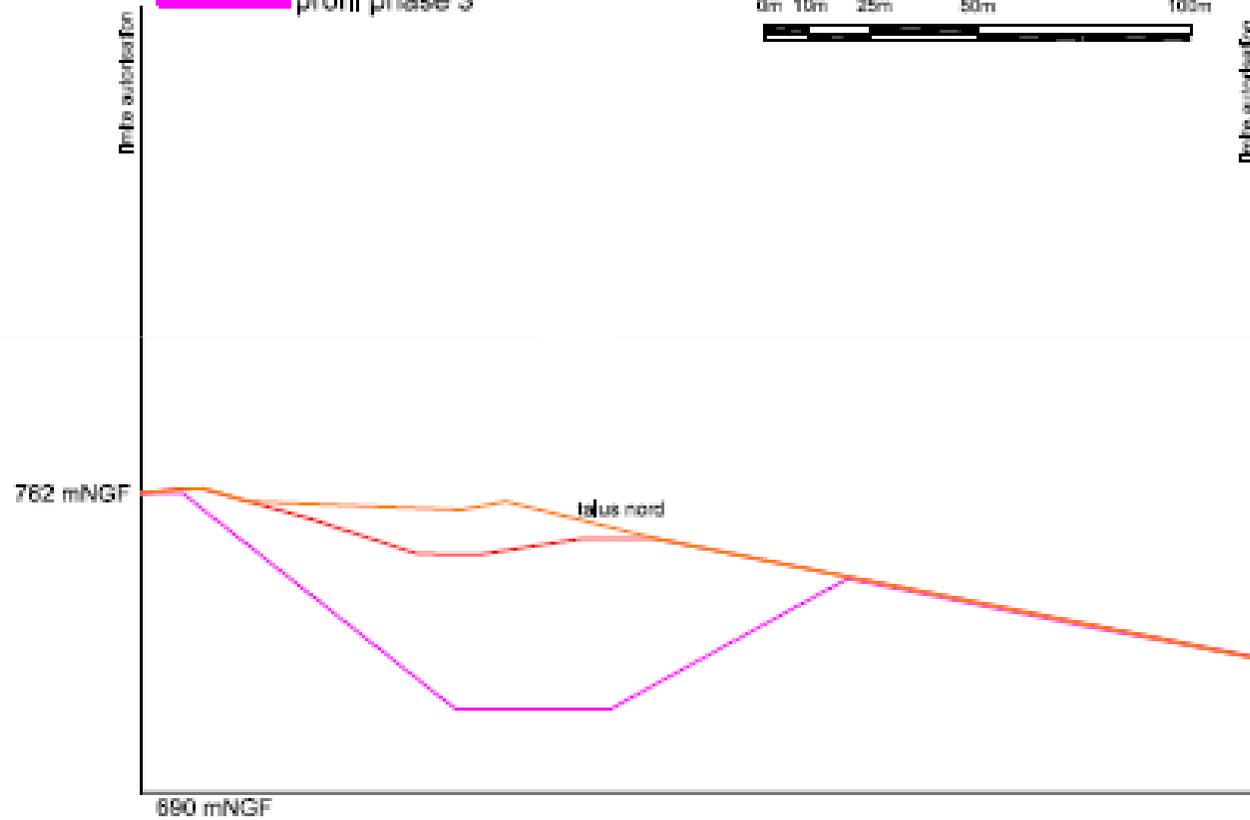

Exploitation depuis la dernière CSS

- Travaux de terrassement sur la partie NORD

Poursuite des travaux de rehaussement de 20 mètres supplémentaires du talus NORD dans sa phase 2

Les terres de découverte et stériles de l'extraction sont utilisés pour la constitution de cette seconde phase au fur et à mesure de l'avancement des fronts de taille

Une prochaine campagne de végétalisation aura lieu à l'automne 2018 pour stabiliser le talus nouvellement réhaussé.

- Jonction effective des fronts NORD et SUD, permise par la création du talus Nord avec une exploitation d'Est en Ouest en dent creuse prévu dans l'AP complémentaire de 2014
- Traitement de la partie supérieure du gisement avec des cribleuses mobiles

Synthèse des dernières analyses effectuées sur le site


Suivi des contrôles de l'Arrêté Préfectoral année 2017

NATURE	DATES	COMMENTAIRES
Rejet IBGN (Indice Biologique Global Normalisé)	08/07/2016	Note : 14/20 en amont, 13/20 en aval
Rejet Analyses	15/03/2017	MES : 6 mg/l DCO : <10mg/l
		Impossibilité d'effectuer un contrôle volontaire depuis juin en raison d'un déficit de pluviométrie.
Air - Dépoussiérage	02/08/2017	Concentration poussières : 2,6 mg/m ³
Air - Retombées	08-09/2016	Nord : 218,6 mg/m ² /jour Sud : 290 mg/m ² /jour
Bruit	06/08/2016	ZER 1 : "Les Fougères". Emergence mesurée à 6 dB(A) ZER 2 : "Malencogne". Emergence mesurée à 1,5 dB(A) ZER 3 : "Coron". Emergence mesurée à 2 dB(A) ZER 5 : "Pré Battoir". Emergence mesurée à 0,5 dB(A) ZER 6 : Camping. Pas d'émergence mesurée
Vibrations	07/07/2016	4 Capteurs : Les Fougères V = 0,64mm/s Malencogne V = 0,51mm/s Bel-Air V = 1mm/s Entrée Carrière V = 0,76 mm/s

Validation des prochains points de mesure

Localisation des points de mesure de bruit

Campagne 2016

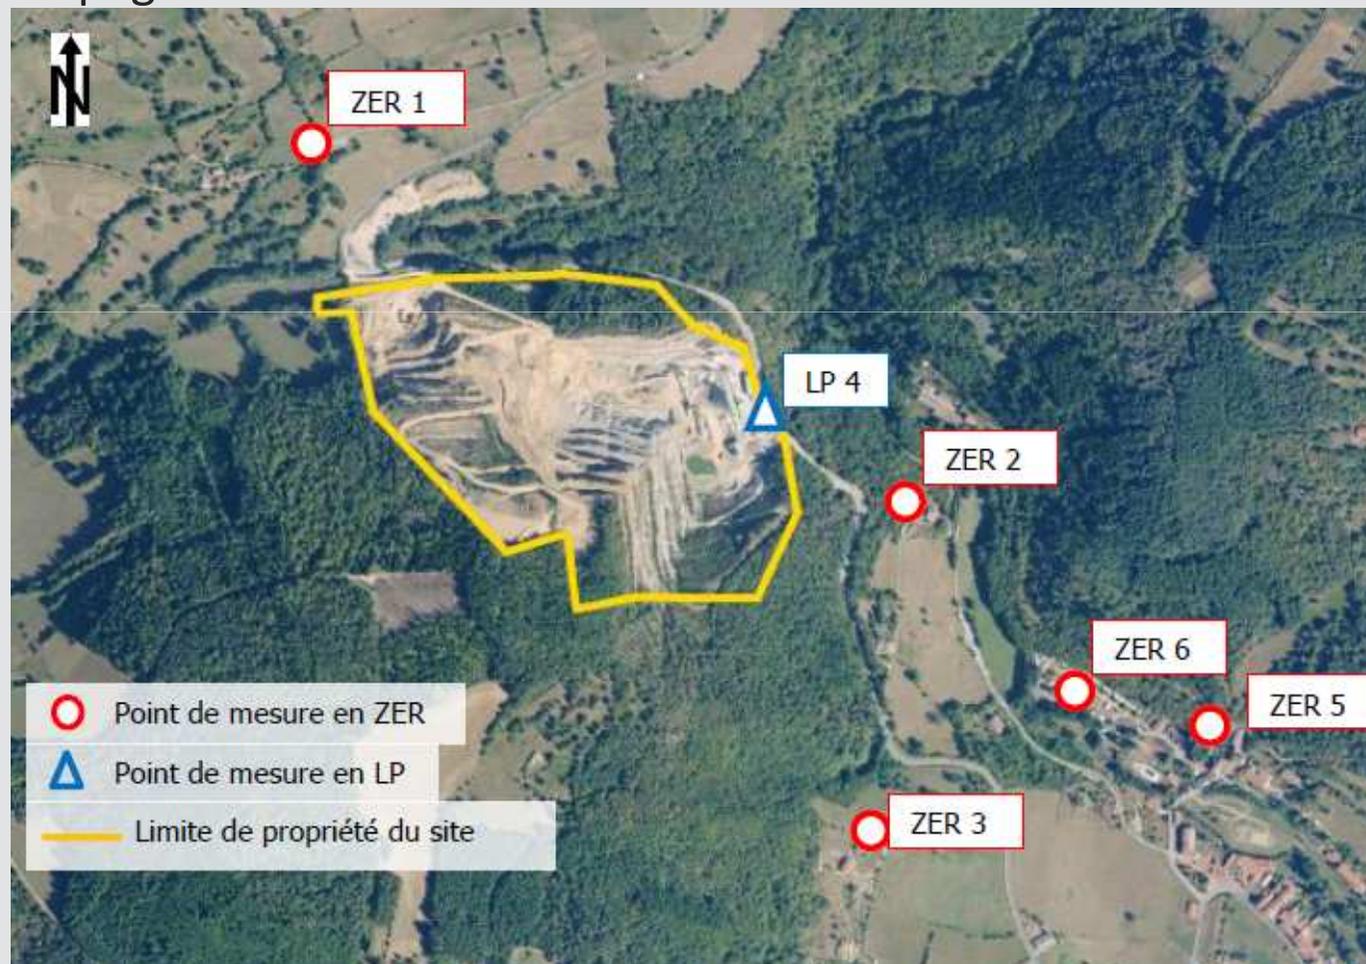

Localisation des points de mesure de vibrations - campagne 2016



**Commission de Suivi des Sites
carrière St Julien M.M. / Colombier
le 23 novembre 2017**

Merci de votre attention
